



Projektstatus Rhein-Sieg-Kreis

Ines Barczewski
Breitbandkoordinatorin




Der Rhein-Sieg-Kreis


- Fläche: 1.153,21 km², 19 Kommunen
- Einer der einwohnerreichsten Kreise in Deutschland mit über 600.000 Einwohnern
- Der Rhein-Sieg-Kreis übernimmt stellvertretend für die Kommunen die Abwicklung des geförderten Breitbandausbaus
- Fördervolumen: 16 Mio. Euro Bundes- und Landesförderung

Eckpunkte zum Projekt

- FTTC/B-Projekt
- Ausbau mit 3 Telekommunikationsunternehmen
 - EFN eifel-net Internet-Provider GmbH
 - innogy TelNet GmbH
 - Telekom Deutschland GmbH
- Erschließung von rund 25.000 Haushalten und ca. 2.500 Gewerbetreibenden
- Glasfaserausbau von 184 Schulstandorte
- Fertigstellung bis Ende 2021

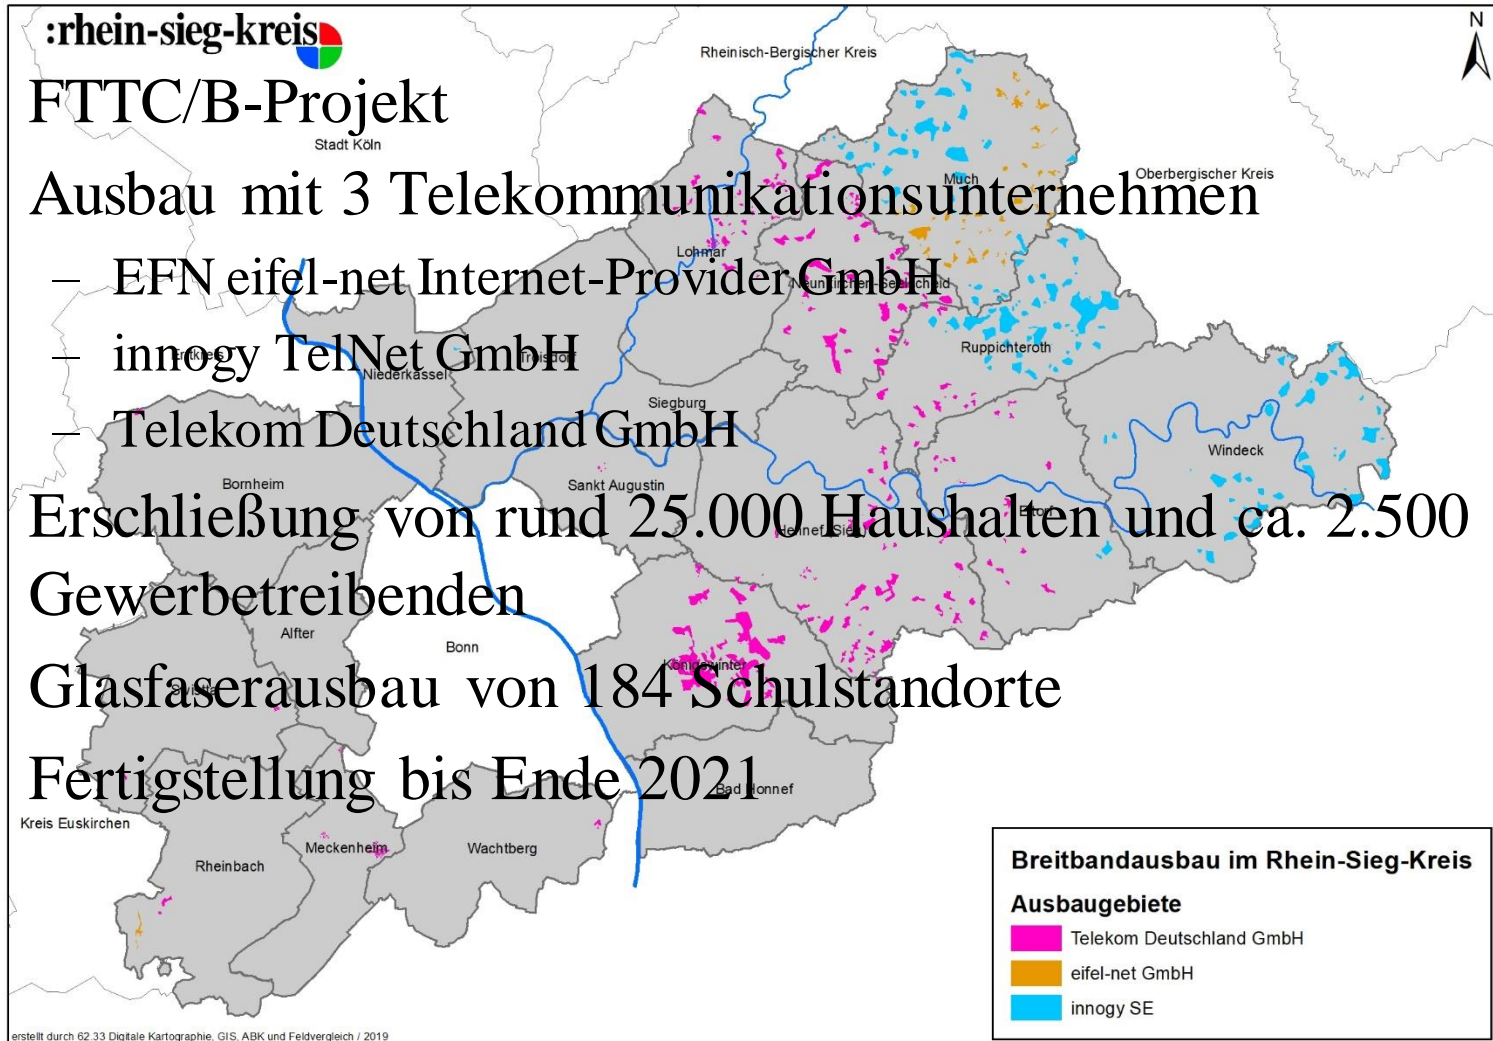

Bundeshförderung - Ablauf

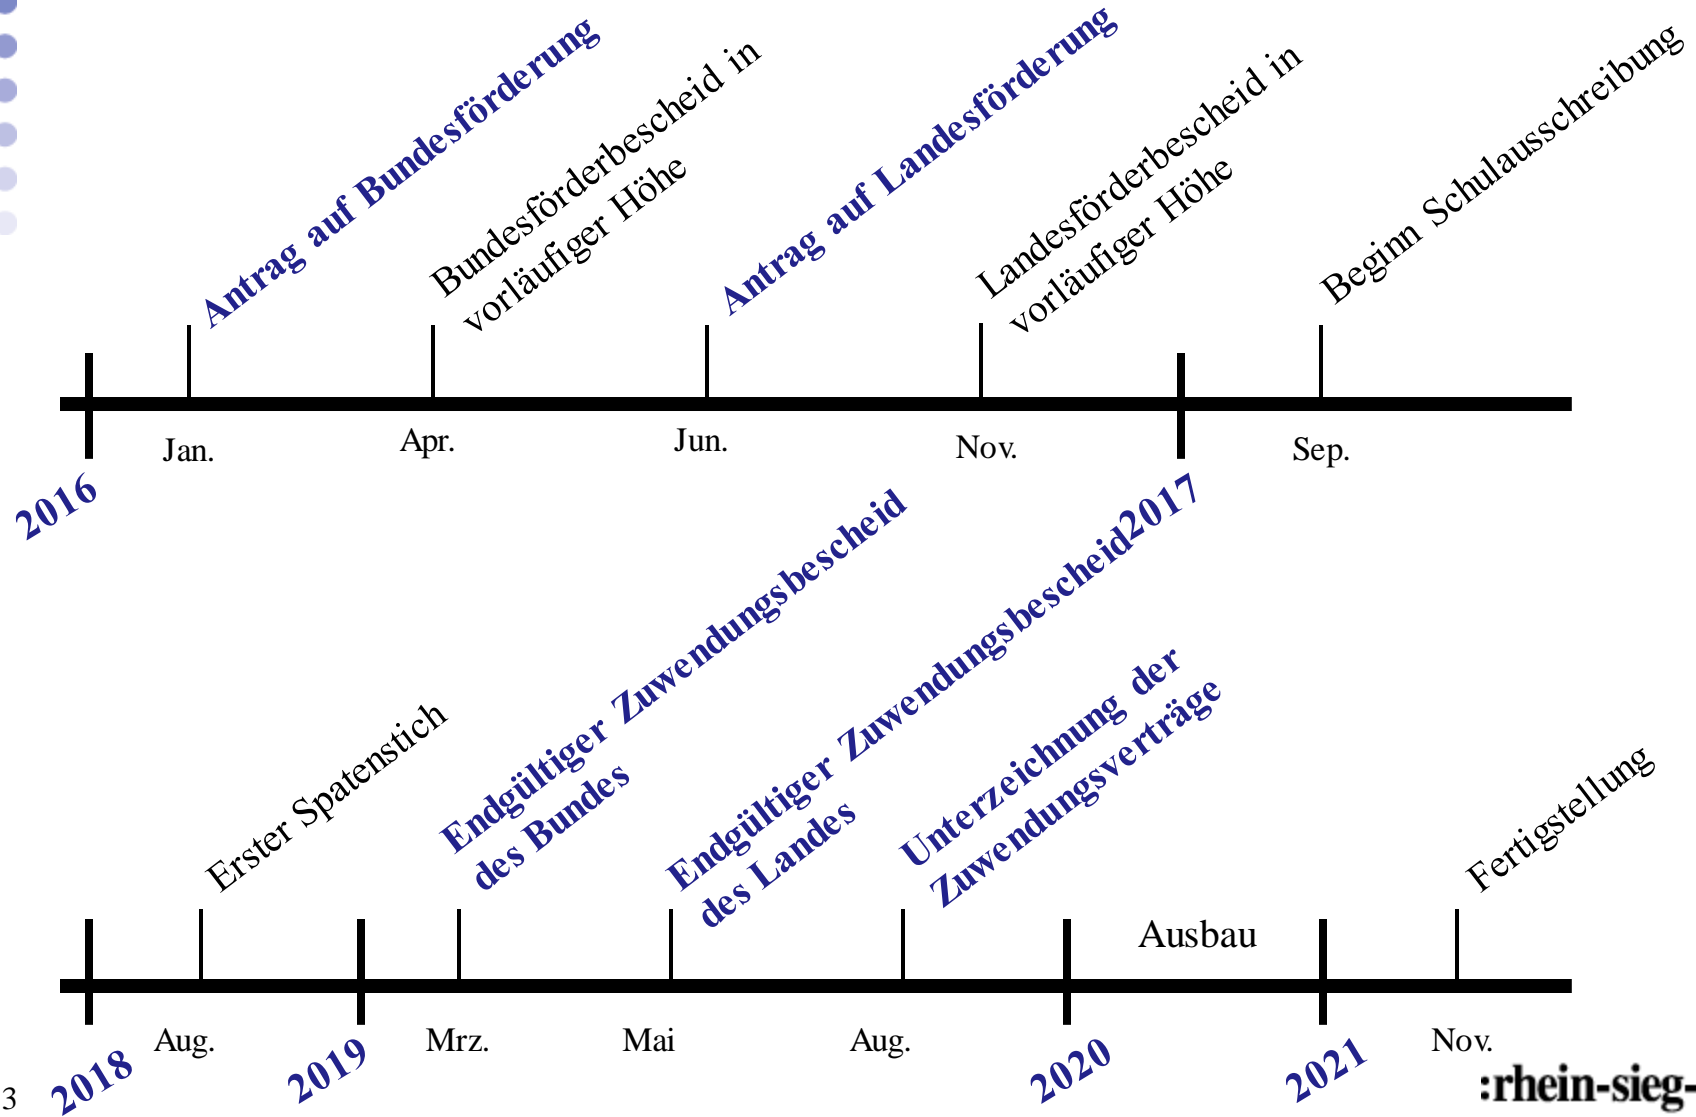

Aktueller Stand (Juli 2020)

- Alle Unternehmen haben bereits mit dem Ausbau begonnen
- Ausgebaute Anschlüsse: ca. 400 Stück
- Realisierter Tiefbau: ca. 120 km
- Angeschlossene Schulen: 20
- Weitere Anschaltungen sind in Vorbereitung





Herausforderungen

- Vielzahl von Genehmigungen müssen eingeholt werden
- Teile der Trassen verlaufen durch Naturschutzgebiete
- Gewässerquerungen
- Teilweise Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur notwendig
- Trotz der aktuellen Corona-Situation:
die Bauarbeiten erfolgen im Zeitplan
 - jedoch Verschiebung von Baubeginnen
 - Gesamtfertigstellungstermin ist nicht in Gefahr



Zusammenfassung

- Umfangreiches Projekt
- Fertigstellung bis Ende 2021
- Viele Herausforderungen sind zu bewältigen, aber das Projekt läuft



Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit
